

Informe de avance

PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTENIDO


Nombre del Proyecto: Modelo de Seguridad y Privacidad

Gerente del Proyecto: JUAN CARLOS ALARCON SUESCUN

Fecha: periodo 1 al 30 septiembre de de 2017

- Estado de cronograma
- Actividades ejecutadas
- Aspectos críticos pendientes
- Próximas actividades

Línea de Tiempo del proyecto

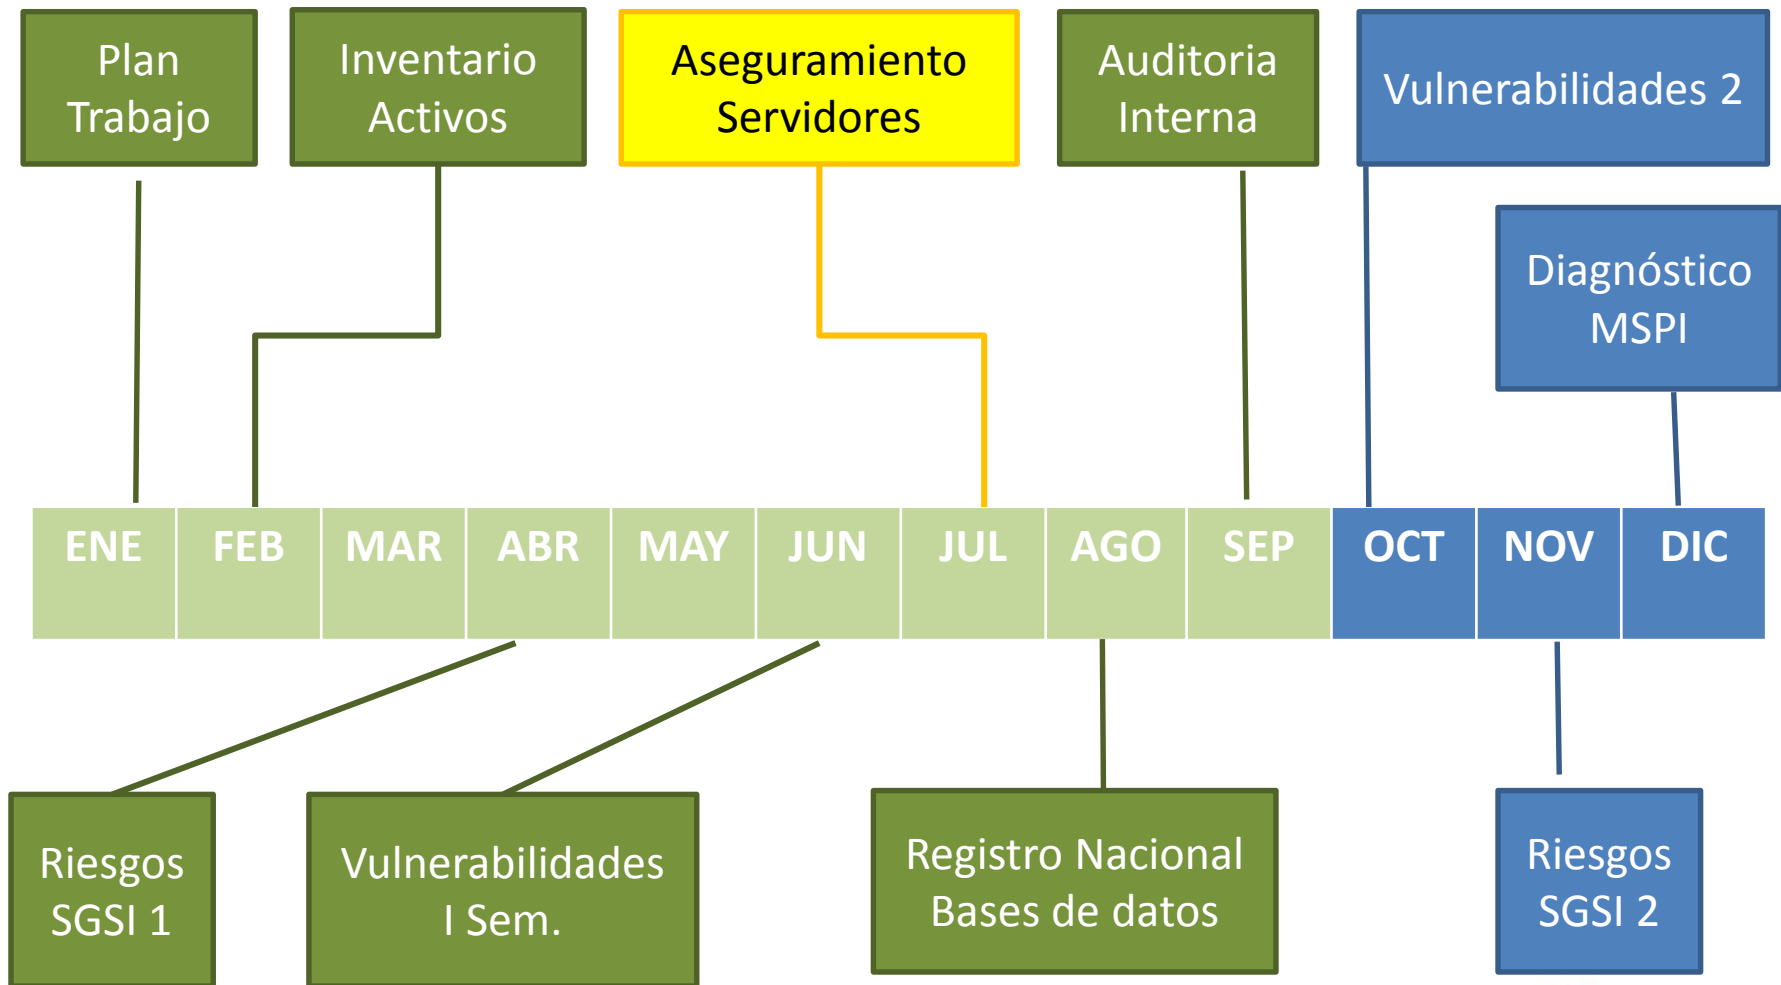

EDT Global del Plan de Seguridad



ESTADO DE AVANCE DEL PLAN

Mes	Tarea	Entregable	Avance	Observación
Sept.	Reuniones del Comando Conjunto Cibernético	Inventario de infraestructura Cibernética Plan Nacional de protección ICCN	85%	Se involucraron nuevas entidades a las mesas de trabajo. El 29 de noviembre se realizan los Cybergames, se inscribieron 2 equipos (CORPOICA, ADR-ICA)
	Seguimiento (Auditoría al SGSI)	Informe de auditoría al SIG	100%	El alcance de la auditoría no cubrió específicamente el SGSI
	Sensibilización en seguridad segundo semestre	Campaña de sensibilización	25%	Se han publicado nuevos tips de seguridad de la información. Sigue pendiente realizar un evento formal de sensibilización
Extras	Actualización de la política de protección de datos personales	Nueva política de datos personales	100%	
	Resoluciones de SIG y Activos de información	Resoluciones	100%	
	Registro nacional de bases de datos	Diagnóstico de controles de BD Personales	35%	4 procesos han enviado sus diagnósticos. Otros procesos están en curso

Novedades

- Se dio inicio al proyecto de implementación del equipo de detección/prevención de intrusos
- MINTIC solicitó comentarios del MinAgricultura al modelo de riesgo digital
- MINTIC publico la resolución que formaliza la obligación de realizar transición al protocolo IPv6 a mas tardar el 31 de diciembre de 2019
- Se publicaron los lineamientos para la implementación de servicios digitales ciudadanos
- MINTIC a través de CINTEL esta brindando apoyo a las entidades para actualizar sus diagnósticos MPSI
- MINTIC actualizó el instrumento de evaluación del MPSI
- MINTIC está solicitando nombres de funcionarios de las entidades del sector para realizar la preparación del centro de respuesta a incidentes de seguridad a nivel sectorial

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA



AVANCE REAL	AVANCE ESPERADO
60%	61%

Varias actividades que fueron inicialmente programadas dentro del plan de seguridad fueron suprimidas porque pertenecen a dominios diferentes del Modelo Gobierno Digital. Documentos de arquitectura – SGSI Evaluaciones de MSPI Sectorial

PROXIMAS ACTIVIDADES

- Ejecución de pruebas de vulnerabilidades para el segundo semestre
- Actualizar el diagnóstico de seguridad con el nuevo instrumento de MINTIC
- Completar el diagnóstico de bases de datos a nivel personal
- Pruebas de correcto funcionamiento del dispositivo IPS/IDS
- Preparar la actualización de riesgos de seguridad institucional del 2do. semestre.

Plan de acción
seguridad de la
información



INQUIETUDES Y APORTES
